מזהה	מצב פעילות	% ביצוע	Task Name	משך	התחלה
0		**0%**	**בייק פארק**	**days 408**	**16/07/23**
1		**0%**	**תכנון, מרכז ותקציב**	**days 144**	**16/07/23**
2		**0%**	**השלמת תכנון לביצוע**	**days 20**	**16/07/23**
9		0%	סיום תכנון	days 0	10/08/23
10		**0%**	**קבלת תקציב**	**days 75**	**16/07/23**
13		0%	אישור קבלת תקציב	days 0	07/11/23
14		**0%**	**מכרז ובחירת קבלן**	**days 144**	**16/07/23**
21		**0%**	**חפירות על ידי רשות העתיקות**	**days 30**	**22/11/23**
22		0%	חפירות גישוש	mon 1	22/11/23
23		0%	שחרור שטח על ידי רשות העתיקות	wks 2	20/12/23
24		0%	סיום עבודות על ידי רשות העתיקות	days 0	02/01/24
25		**0%**	**צ.ה.ע ומשך חוזי לקבלן**	**days 238**	**14/02/24**
26		0%	צ.ה.ע	days 0	14/02/24
27		0%	10 חודשי ביצוע	emons 10	14/02/24
28		0%	12 חודשי ביצוע כולל פאבר מזמין ומסירות	emons 2	10/12/24
29		**0%**	**ביצוע ע"י קבלן**	**days 232**	**15/02/24**
30		**0%**	**אישורים והזמנות ע"י הקבלן במקביל לביצוע**	**days 60**	**15/02/24**
31		**0%**	**היתרים ואישורים**	**days 25**	**15/02/24**
32		0%	היתר חפירה	wk 1	15/02/24
33		0%	הוצאת אישורי כריתה והעתקה	wks 2	07/03/24

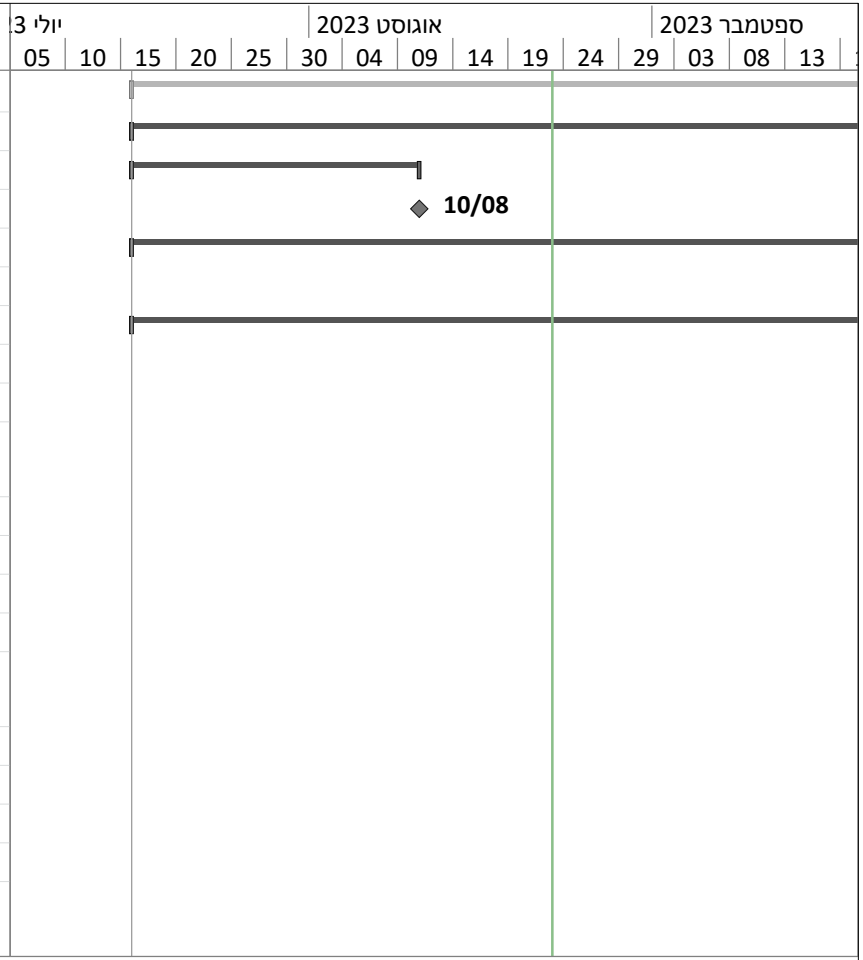

Project: בייק פארק
Date: 23/08/23

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		התקדמות ידנית	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

מזהה	מצב פעילות	ביצוע %	Task Name	משך	התחלה
34		**0%**	**הזמנת צוותים מחו"ל**	**60 days**	**15/02/24**
35		0%	אישור עבודה	2 mons	15/02/24
36		0%	הגעת צוותים	1 mon	11/04/24
37		**0%**	**ביצוע**	**207 days**	**21/03/24**
38		**0%**	**התארגנות**	**10 days**	**21/03/24**
39		0%	התארגנות	1 wk	21/03/24
40		0%	הצבת הסדר	2 days	28/03/24
41		0%	כריתה והעתקה	1 wk	28/03/24
42		0%	סיום התארגנות באתר	0 days	03/04/24
43		**0%**	**יציקת קיר תמך - קיר מערבי**	**10 days**	**01/04/24**
44		0%	יציקת כולנסאות	2 wks	01/04/24
45		**0%**	**עבודות עפר, חפירה ותשתיות**	**30 days**	**15/04/24**
46		0%	עבודות עפר	2 wks	15/04/24
47		0%	הנחת תשתיות ניקוז	2 wks	15/04/24
48		0%	קווי אינסטלציה פנימים	2 wks	07/05/24
49		0%	הנחת תשתית תאורה	2 wks	23/05/24
50		**0%**	**מצעים ושבלנות**	**20 days**	**06/06/24**
51		0%	השלמת עבודות עפר	1 wk	06/06/24
52		0%	הכנת שבלנות ומצעים	3 wks	17/06/24
53		**0%**	**עבודות בטון ותשתיות פנימיות**	**100 days**	**08/07/24**
54		0%	עבודות בטון והשלמת עבודות תשתית	5 mons	08/07/24
55		**0%**	**גמר ופיתוח**	**30 days**	**05/12/24**



Project: בייק פארק
Date: 23/08/23

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		התקדמות ידנית	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

מזהה		מצב פעילות	ביצוע %	Task Name	משך	התחלה
56			0%	משטחי גומי	1 mon	05/12/24
57			0%	גינון	1.5 mons	05/12/24
58			0%	תאורה	1 mon	05/12/24
59			0%	שילוט	1 mon	05/12/24
60			0%	פרגולות	1 mon	05/12/24
61			0%	ריהוט	1 mon	05/12/24
62			0%	השלמת עבודות גמר ופיתוח- באפר מזמין (דגש על השלמות ריהוט וגינון	2 wks	16/01/25
63			0%	ס.בצ	0 days	29/01/25
64			**0%**	**מסירות**	**30 days**	**30/01/25**
65			0%	מסירות	1.5 mons	30/01/25

יולי 23 | אוגוסט 2023 | ספטמבר 2023

05 10 15 20 25 30 04 09 14 19 24 29 03 08 13

Project: בייק פארק
Date: 23/08/23

Task	Inactive Task	Start-only
Split	Inactive Milestone	Finish-only
Milestone	Inactive Summary	Deadline
Summary	Manual Task	Progress
Project Summary	Duration-only	התקדמות ידנית
External Tasks	Manual Summary Rollup	
External Milestone	Manual Summary	
