הערות חשובות:

1. יש להבטיח מעבר להי"ר ברוחב מזערי 1.3 מי נקי ממכשולים, בהתאם לפרט.
2. כניסה ויציאה משאיות קטנות (בובקאט) לאתר עבודה בליווי מכוון תנועה.
3. בזמן עבודה כניסה ויציאה ה"ר למגרשים פרטיים בליווי מכוון תנועה ובתוואי נקי ממכשולים.
לאחר סיום פעילות העבודה (07:00-17:00) יש לשמור על מעבר הולכי רגל נקי ממכשולים ברוחב 1.3 מי.
4. יש להשתמש בכלי עבודה קטנים (בובקאט) או ניידים.
5. בשטחי עבודה שחורגים מקו זכות דרך או יעוד מעבר ציבורי, יש לבצע תיאום עם דיריים.
6. ביצוע פס האטה ומיקום חצייה ברחי רבי מאיר לפני התחלת עבודה על כל מעברים.

משך זמן הביצוע: 3 חודשים

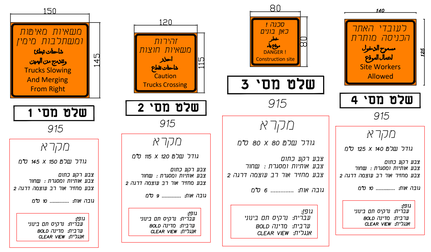

הערות כלליות לביצוע הסדרי תנועה ובטיחות לעבודות במעבר 66 ברחוב רבי מאיר

1 - מהות העבודה: שדרוג מעבר הולכי רגל קיים כולל ריצוף, גישות, תאורה,...).
2 - אין לבצע חפירות במקומות יש גישות לבתים קיימים.
3 - באחריות הקבלן להודיע לתושבי הרחוב לפני ביצוע העבודות לפי הוראת העירייה.
4 - לפני תחילת העבודה יש לפרסם בעיתונות המקומית ובעלונים לתושבים על ביצוע העבודה.
ומשך הזמן במו כן יש ליידע את מ.ד.א. - מכבי אש - משטרה וחברות האוטובוסים הציבורים על ביצוע העבודה.
5 - לפני תחילת העבודה יש להציב את התמרורים המסומנים בתוכנית השלב.
6 - זמני העבודה לפי הוראת המשטרה.
7 - כל התמרורים יהיו בגודל עירוני.
8 - רמת החזור אור ירעות דרגה 2 רב עוצמה.
9 - גדר רשת להי"ר תהיה שקופה מפלדה ובגובה 2.00 מטר.
10 - מחיקת הצבעים באמצעות לחץ מים או כדוריות פלדה.
11 - באחריות הקבלן לדאוג לתאורה פעילה לכל זמן העבודות.
12 - כניסה ויציאה לאתר עבודה בליווי מכוון תנועה.
13 - יש להבטיח מעבר מוסדר ובטוח להי"ר (מינימלי 1.30 מטר).
14 - במעבר חציה בזרועות הצומת- התקנת גדר רשת בגובה תקני נמוך למניעת הסתרת ראות.
15 - יש להחזיר המצב לקדמותו בגמר כל שלב (מיסעה כולל אספלט).
16 - יש להסיר בגמר כל שלב את התמרורים והשלטים שהוצבו לצורך אותו השלב.
17 - גובה התחתית תמרורים ושלטים 2.20 מי מינימום.
18 - יש לגדר את אזורי העבודה בכל שלב (גדר רשת).
19 - בעבודות לילה יוצבו תמרורים ניידים, תיקניים ע"ג חצובות.
20 - יש לכסות תמרורים סותרים
21 - אין להשאיר על שטח הכביש אבני ריצוף או אבני שפה בצורה לא מאובטחת.
22 - כל מימני הכביש יבוצעו בצבע תיקני בלבד.
23 - בכל שאלה ו/או בהירות יש לפנות לחברת קראוס חן - טל:02-5328814

תרשים סביבה:

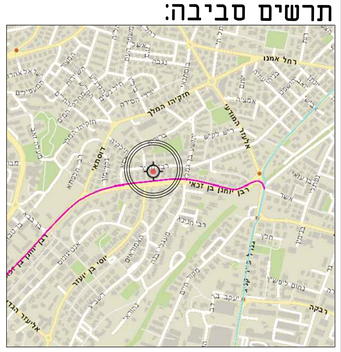

תצ"א:

פרט א:

מקרא

- אתר עבודה מגודר
- מעבר זמני נייד להולכי רגל
- אספלט קיים
- זכות דרך
- גבול מגרשים
- גדר רשת מפלדה תקנית בגובה 2.00 מ'
- צבע קיים
- צבע קיים לביטול
- צבע חדש
- אבן שפה טופית
- תמרור לביטול
- תמרור קיים
- תמרור חדש להצבה
- לוח נייד גובה 2.5 מ', רוחב 1.7 מ'
- תמרור 930 להצבה כל 5 מ' ותמרור 932 להצבה על תמרור 930 כל 10 מ'

באחריות המהנדס\ עורך התוכנית ורשות המקומית לביצוע בקרות בהתאם להנחיות משרד התחבורה:

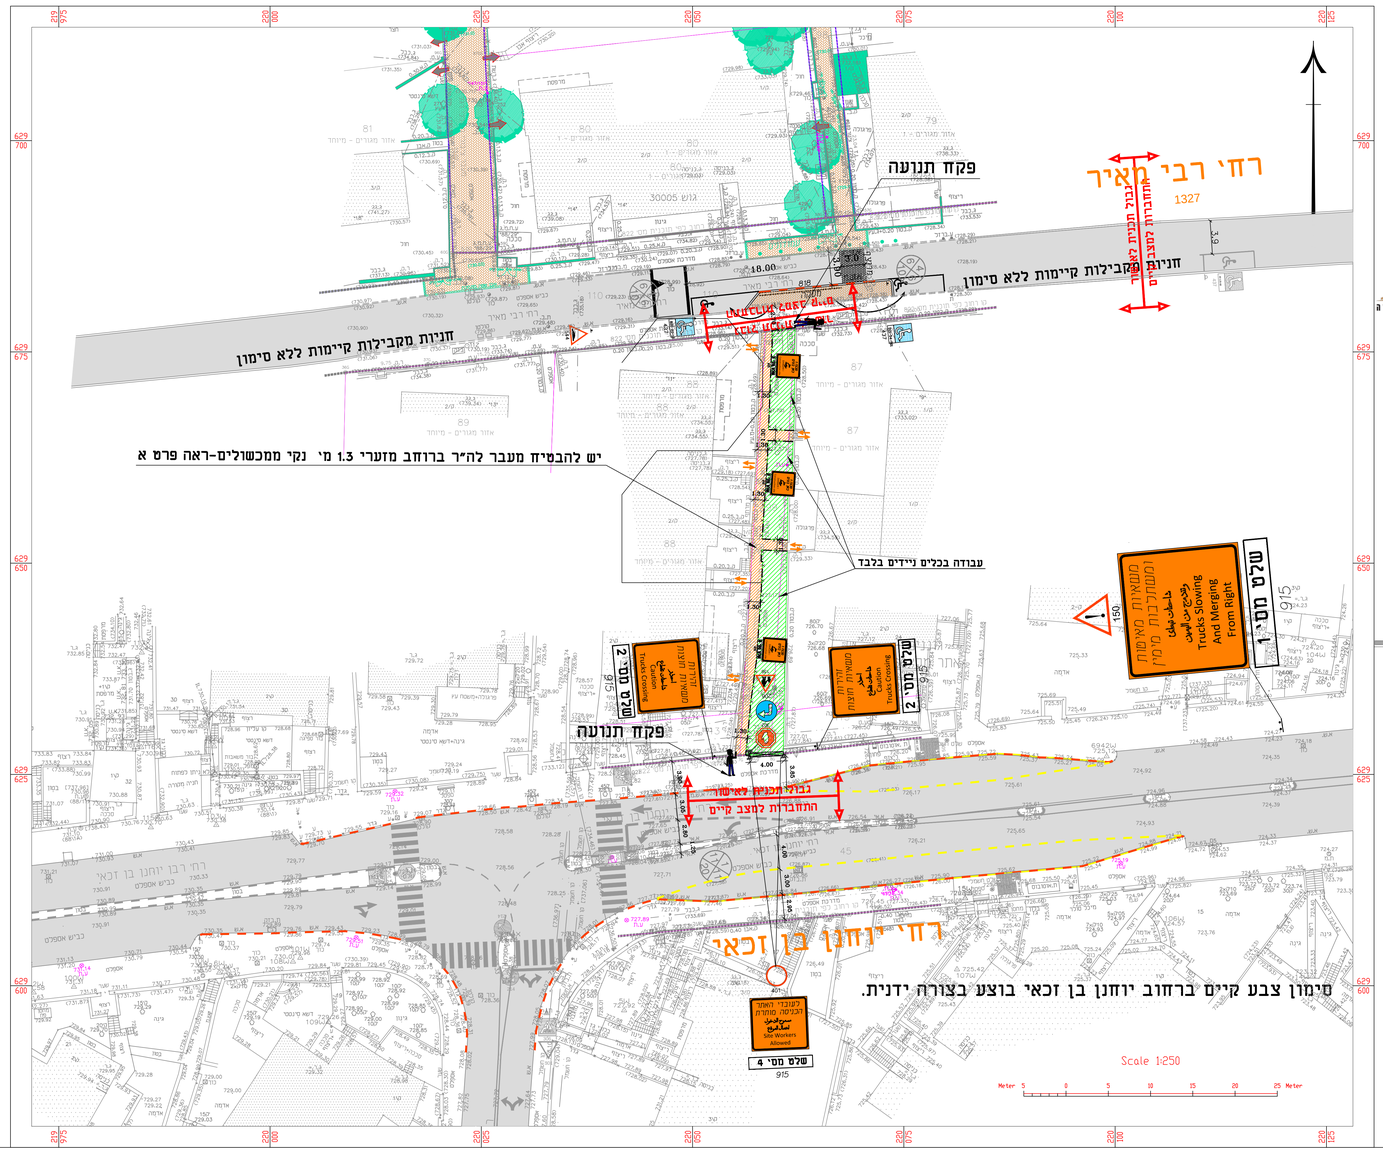

28/03/2024

עבור: יאסיס אבו ליל,
מנהל מחלקה בכיר מתכנון הסדרי תנועה וסביבה,
אגף התבורה ומיפוח השוטרים

הנדון: אישור הסדרי תנועה זמניים – מעברים מס' 66-69

שלום רב,
אנו מבקשים לאשרן אותך כי:

1. תוכנית הסדרי תנועה זמניים התעבדו למנהל הקהילתי בתאריך 07.03.2024.
2. לבקשת המנהל הקהילתי, מבקשים לבחון היתכנות לבטמנים ביטול חניות בתוך עבודות יש לשלטיין לבצוע מעברים לא נמשכים, כדי לצמצם ככל הנתון את ביטול מקומות החניה בתוך העבודות.
3. בקשת המנהל ריצוף מול קבלן הביצוע ויאפשר לבטל כדי לצמצם פריצה ככל הנתון בשקומות חתיה בתוך עבודות
4. לאחר סיום בשלמה הבדיקה הכניסה לדיירות סמוכים ובלים למעבר 69 - לא ניתן לסיומם את מעבר 69 הרוסטית בתוך עבודה, קיימות נגישות לבתים שלא ניתן לסיומם אלחוץ מחוצמרים הבנלים
5. לתמחה, כל תיקונים שביקשת לבצע בתוכנית, בוצעו ע"י מתכנן התנועה.

נודה לאישורך.

בברכה,
חגיגה עבדיה
מנהלת פרויקט
מקצוע הנדסה בנים

GRINCH@GRIBOA-ENG.CO.IL 055-3-6492881 : מס' 03-6492881 | מס' פקס 0501122 | מס' נייד 0501122 | מס' ת.ז. 0

הנדון : פרויקטים מצרניים הקו הסגול
מעברים 66-69

אנו ותחתום מטה אייל קראוס מספר רישיון 88003 מתכנן הסדרי תנועה וסמיים בפרויקט הנ"ל
מצהיר בזאת שתוכניות נערכו על ידי השלוחאמות את התחיות ולפח המתרוריים.

רשימת תכניות			
מס' תוכנית	שם תוכנית	קנ"מ	
1723-47-500-01	מעבר הי"ר מס' 67	1:250	
1723-48-500-01	מעבר הי"ר מס' 68	1:250	
1723-49-500-01	מעבר הי"ר מס' 69	1:250	
1723-49-500-01	מעבר הי"ר מס' 69	1:250	

15.02.2024
תאריך

חתימה

ירושלים	חיפה	תל אביב
רח' הדיקן 22	אחוזת הכרמל 2 בית אשר	יגאל אלון 65, מגדל טיפוח, בית א
02-5328814	04-8152600	03-3726400
kornaus@kornaus.co.il		

נייגוב פרוייקט	גבטוב הנדסה
אדר"כלות	אר"מ
תנועה	אי"ל קראוס
כבישים	
אדריכלות נוף	
קונסטרוקציה	
אינסטלציה	
מים וביוב	
חשמל	
מבנה/קרקע	
תוקיר	
תאריך	

www.gibb.co.il

עדכונים ושינויים

מס'	תאריך	מהות הנדכון/שינוי
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

שם פרויקט: פרויקטים מצרניים הקו הסגול

תכנית: תכנית הסדרי תנועה זמניים
מעבר הי"ר מס' 66
מספר תיק תיאום: 812040

מס' פרויקט: 17-2023	**מס' נייגוב:** 1723-66-500-03
קנ"מ: 1:250	**תאריך:** 11.10.2024
מרשם: בשארה	**תכנן:** בשארה \ פאדי
בקר: אייל	**אישר:** אייל
ויתחר ○	**תב"ע** ○
לעיון ○	**לאישור עקרוני** ○
לאישור ○	**לסכרז** ○
לביצוע ●	

קראוס-חן
הנדסת תנועה ובכישים בע"מ

לשרד תקן
ISO 9001:2015

מאשר | חתימה

מזמין: תכנית אב לתחבורה

מ:\מזמין\קראוס\1723-66-1.dwg x\,2023\,17-2023\,traffic\66,68\,xref\

המצאנו אחראי לבדיקת המידות והלאומיות בתחום.
ולגודיש כשאר המתכנן על כל מנת אי אי - הלאומה.
